

陸前高田市震災復興計画について

1 陸前高田市震災復興計画及び震災復興実施計画について


【計画策定の趣旨】

本市では、平成23年12月に「海と緑と太陽との共生・海浜新都市の創造」をめざすまちの姿とする「陸前高田市震災復興計画」（以下「震災復興計画」という。）を策定し、平成23年度から平成25年度までの3年間を「復興基盤整備期」、平成26年度から平成30年度までの5年間を「復興展開期」として、これまで復興に向け取り組んできたところである。

しかしながら、時間の経過とともに、震災復興計画策定時からの状況の変化も見られることから、震災復興計画に掲げた主要事業について、現状に即した見直しを行うとともに新たに必要とされる事業を追加した上で、陸前高田市震災復興実施計画（以下「震災復興実施計画」という。）を策定し、震災復興計画の基本構想や基本計画の実現に向けた主要事業を示すものである。

なお、掲載している主要事業は、社会経済情勢の変化や復興の状況等を踏まえ、必要に応じて、所要の見直しを行っていくものである。

震災復興計画

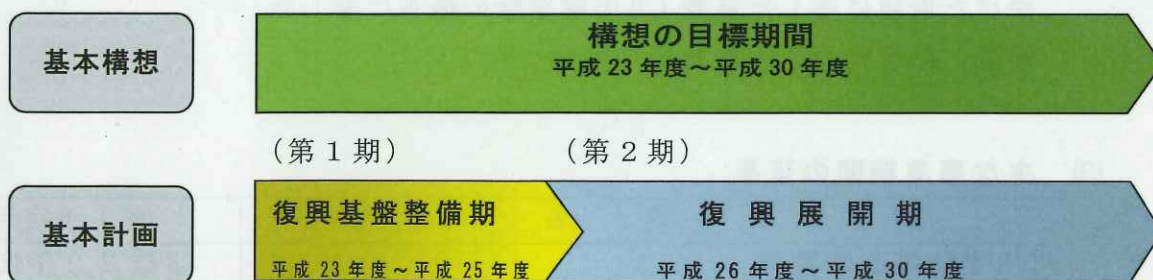

震災復興実施計画

2 平成29年度における震災復興実施計画の改定について

(1) 震災復興実施計画等全体の進捗状況

平成29年度末時点での主要事業全体の取組状況については、全165事業（統合・廃止済の5事業を除く）のうち51事業が完了する見込みである。

《震災復興計画における6つの復興のまちづくりの基本方向ごとの主要事業の進捗状況》


まちづくりの基本方向	全事業	うち完了済事業数及び完了時期									統合・廃止
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31以降	
災害に強い安全なまちづくり	17	-	-	1	2	2	-	1	4	7	1
快適で魅力のあるまちづくり	21	-	-	-	-	-	-	1	8	12	-
市民の暮らしが安定したまちづくり	52	-	2	1	4	2	2	4	23	14	1
活力あふれるまちづくり	68	10	2	-	9	3	5	-	27	12	3
環境にやさしいまちづくり	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
協働で築くまちづくり	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
合 計	165	10	4	2	15	7	7	6	66	48	5
完了事業数累計		10	14	16	31	38	45	51	117	165	

(2) 震災復興計画等の推進に要する事業費（市実施分）の状況

ア 各主要事業のうち、市が実施する取組に要する事業費の状況については、平成29年度末時点において、総額でおよそ350億円が見込まれている。

イ このうち、平成23年度から平成29年度末までに市が執行及び予算計上した事業費の総額は、およそ240億円であり、総事業費ベースでおよそ70%が執行・予算化されている。

《主要事業（市実施分）の総事業費》

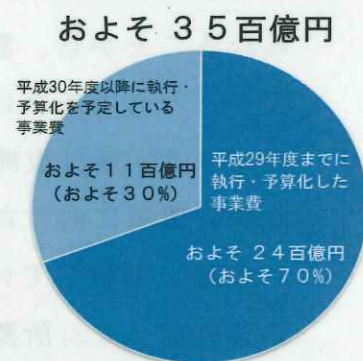

※ 主要事業のうち、他の実施主体（国・県等）の取組に要する経費は含まれていない。また、市が実施する取組であっても、主要事業に位置付けていない復興に向けた取組に要した経費（災害廃棄物の撤去に要した経費、派遣職員の人件費等）は含まれていない。

※ 平成29年度末見込みであること。

(3) 主な事業期間の延長

事業名	完了予定年度
河川堤防等改修事業	平成32年度
消防屯所建設事業	平成31年度
復興道路整備事業	平成32年度
津波復興拠点整備事業（高田南地区）	平成32年度
防災道路網整備促進事業	平成32年度
公共下水道等整備事業	平成32年度
大肝入屋敷（大庄屋）復元事業	平成32年度以降
博物館・海と貝のミュージアム整備事業	平成32年度
道の駅等観光施設整備事業	平成31年度
（仮称）一本松記念館整備事業	平成32年度以降

- 3 陸前高田市震災復興実施計画（資料 3 - 1）
- 4 主要事業のロードマップについて（資料 3 - 2）
- 5 高田地区・今泉地区における公共施設・道路等完成時期について
（資料 3 - 3）
